График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

ЛОТ 1

Наименование улицы, виды работ	ед изм	колич	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
ул.Зеленая, от улицы Галичская до улицы Петра Щербины						1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП			
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																										
Замена бортового камня	п.м	50,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	32 746,60																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	355,60																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	9336/901																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	44210,9/5 526																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	300/36																								
Ремонт колодцев	шт.	4,00																								
ул.Индустриальная, от Кинешемского шоссе до улицы Долгая Поляна, включая участок от улицы Профсоюзная до 1 съезда						1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП			
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	80,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 10 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	15 171,54																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	77,09																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	15212/1 469																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	15212/1 902																								
Укладка тактильной плитки	м2	9,00																								
Ремонт колодцев	шт.	12,00																								
Разметка	км/м2	2,455/457,99																								
ул.Профсоюзная, от улицы Индустриальная до улицы 2-я Волжская						1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП			
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, замена переходов трубопровода, замена сети трубопровода, переключение водопроводного ввода.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	97,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	25 581,30																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	129,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	93,10																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	25719,5/2 485																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	25719,5/3 215																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	59,8/7																								
Укладка тактильной плитки	м2	37,25																								
Ремонт колодцев	шт.	22,00																								
Разметка	км/м2	5,161//1223,56																								
ул.Центральная от Кинешемского шоссе до улицы Сутырина						1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП			
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция сети, замена сети, строительство сети.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	2 730,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	15 572,90																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	776,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	109,48																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	16491/1 545																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	16491/2 061																								
Ремонт тротуаров, установка бортового камня БР 100.20.8	м2/тн/п.м	3777,5/441/1398																								
Укладка тактильной плитки	м2	106,50																								
Восстановление газонов	м2	5 570,00																								
Ремонт колодцев	шт.	41,00																								
Валка деревьев	м3	4,80																								
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м	4/71																								

Разметка	км/м2	1,2832/504,49
ул.Димитрова от шоссе Кинешемского до улицы Энергетиков		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство сети водопровода, реконструкция сети водопровода.		
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний		
Замена бортового камня	п.м	2 494,00
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	27 118,62
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	1 328,00
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	308,60
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	28366,8/2 740
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	28366,8/3 545
Ремонт тротуаров, установка бортового камня БР 100.20.8	м2/тн/п.м	4605,6/551/3407
Укладка тактильной плитки	м2	60,50
Восстановление газонов	м2	5 579,00
Ремонт колодцев	шт.	55,00
Валка деревьев	м3	16,00
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м.	11/72
Разметка	км/м2	4,163/519,2

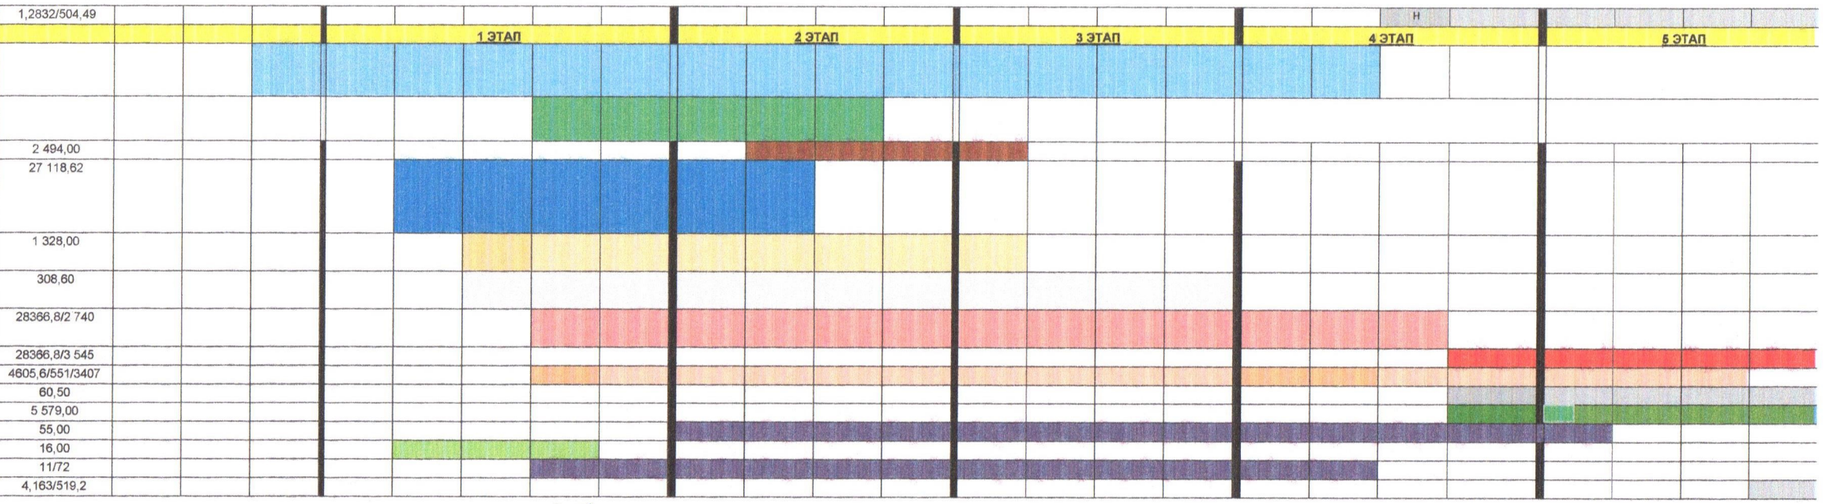

Директор МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора
ООО "Дормострой"
О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"
П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"
И.В. Шипова
