График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

ЛОТ 1

Наименование улицы, виды работ	ед изм	колич	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
ул.Зеленая, от улицы Галичская до улицы Петра Щербины								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																										
Замена бортового камня	п.м	50,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	32 746,60																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	355,60																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	9336/901																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	44210,9/5 526																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	300/36																								
Ремонт колодцев	шт.	4,00																								
ул.Индустриальная, от Кинешемского шоссе до улицы Долгая Поляна, включая участок от улицы Профсоюзная до 1 съезда								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	80,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 10 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	15 171,54																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	77,09																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	15212/1 469																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	15212/1 902																								
Укладка тактильной плитки	м2	9,00																								
Ремонт колодцев	шт.	12,00																								
Разметка	км/м2	2,455/457,99																								
ул.Профсоюзная, от улицы Индустриальная до улицы 2-я Волжская								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, замена переходов трубопровода, замена сети трубопровода, переключение водопроводного ввода.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	97,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	25 581,30																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	129,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	93,10																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	25719,5/2 485																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	25719,5/3 215																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	59,8/7																								
Укладка тактильной плитки	м2	37,25																								
Ремонт колодцев	шт.	22,00																								
Разметка	км/м2	5,161//1223,56																								
ул.Центральная от Кинешемского шоссе до улицы Сутырина								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция сети, замена сети, строительство сети.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м	2 730,00																								
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	15 572,90																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	776,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	109,48																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	16491/1 545																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	16491/2 061																								
Ремонт тротуаров, установка бортового камня БР 100.20.8	м2/тн/п.м	3777,5/441/1398																								
Укладка тактильной плитки	м2	106,50																								
Восстановление газонов	м2	5 570,00																								
Ремонт колодцев	шт.	41,00																								
Валка деревьев	м3	4,80																								
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м	4/71																								

Разметка	км/м2	1,2832/504,49
ул.Димитрова от шоссе Кинешемского до улицы Энергетиков		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство сети водопровода, реконструкция сети водопровода.		
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний		
Замена бортового камня	п.м	2 494,00
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной до 5 см с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	27 118,62
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	1 328,00
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	тн	308,60
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	28366,8/2 740
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	28366,8/3 545
Ремонт тротуаров, установка бортового камня БР 100.20.8	м2/тн/п.м	4605,6/551/3407
Укладка тактильной плитки	м2	60,50
Восстановление газонов	м2	5 579,00
Ремонт колодцев	шт.	55,00
Валка деревьев	м3	16,00
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м.	11/72
Разметка	км/м2	4,163/519,2

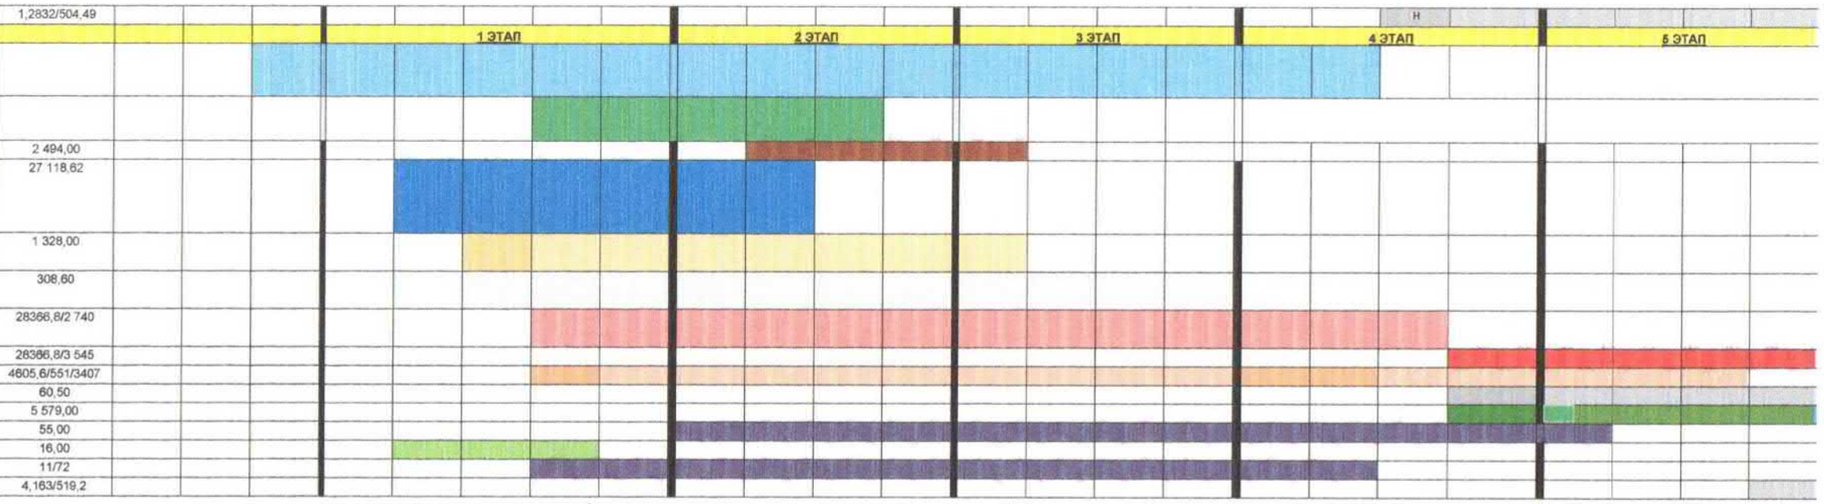

Директор МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора
ООО "Дормострой"
О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"
П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"
И.В. Шипова

График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

ЛОТ 2

Наименование улицы, виды работ	ед изм	колич	апрель 2022			май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
ул. Федосеева от ул. Симановского до ул. Коммунаров								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП	
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, замена коллектора, промывка коллектора.																									
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																									
Замена бортового камня	п.м.	1 075																							
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	6 390,00																							
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	100,00																							
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	44,5																							
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	6490/608																							
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	6490/811																							
Ремонт тротуаров	м2/тн	2637/303																							
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 405,00																							
Укладка тактильной плитки	м2	39,00																							
Ремонт колодцев	шт	17																							
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м	3/16																							
Восстановление газонов	м2	3482																							
Разметка	км/м2	0,962/682,26																							
ул. Терешковой, от ул. Островского до ул. Козуева								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП	
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция канализации, строительство водопроводного ввода																									
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																									
Замена бортового камня	п.м.	2 406																							
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	11 892,90																							
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	388,50																							
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	82,80																							
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	12437,5/1165																							
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	12437,5/1555																							
Ремонт тротуаров	м2/тн	6552/765																							
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 899,0																							
Укладка тактильной плитки	м2	92,00																							
Валка деревьев	шт	3																							
Ремонт колодцев	шт	51																							
Восстановление газонов	м2	3947																							
Разметка	км/м2	1,003/955,4																							
ул. Пятницкая, от ул. 1 Мая до ул. Ленина								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП	
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция сети канализации																									
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																									
Замена бортового камня	п.м.	2 220																							
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	12 894,4																							
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	168,0																							
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	149,5																							
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	13906,7/1343																							
Устройство верхнего слоя покрытия из толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	13906,7/1738																							
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	2 004,0																							
Ремонт тротуаров	м2/тн	5259/630																							
Ремонт колодцев	шт	42,00																							
Укладка тактильной плитки	м2	67																							
Восстановление газонов	м2	2728,8																							
Замена барьерных ограждений	п.м.	216																							
ул. 1 Мая, от улицы Молочная гора до улицы Чайковского								1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП	
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство водовода.																									
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																									
Замена бортового камня	п.м.	1 514																							
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	7 457,54																							
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	24,00																							
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	83,4																							
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	7758,5/749																							
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	7758,5/970																							
Ремонт тротуаров	м2/тн	1159,1/139																							
Разборка тротуарной плитки со складированием	м2	162,40																							
Устройство покрытий из тротуарной плитки BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая, м2 со стоимостью	м2	20,50																							
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	428,00																							
Укладка тактильной плитки	м2	10,50																							
Восстановление газонов	м2	5579,0																							
Ремонт колодцев	шт	12,00																							

Директор МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы
"Дорожное хозяйство"
Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора
ООО "Дормострой"
О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы
"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"
П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2"
И.В. Шипова

График производства ремонтных работ в рамках Национального проекта БКАД в 2022 году.

ЛОТ 3

Наименование улицы, виды работ	ед изм	колич	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
улица Никитская, от улицы Энгельса до улицы Смирнова Юрия						Д		Д	Д Д	Д						Д					Н Д	Д	5 ЭТАП			
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство сети водоснабжения, замена сети водопровода.																										
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети ул. Никитская 1ТК-51 до ТК-53, ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	4 173,00																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	28 858,00																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	504,00																								
Устройство парковок и съездов	м2	870,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	352,40																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	32776/3166																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	32776/4097																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	9723,2/1165																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	4 186,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	115,50																								
Ремонт колодцев	шт	41,00																								
Восстановление газонов	м2	5 101,00																								
Замена барьерных ограждений	п.м.	170,00																								
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	км/м2	6/100																								
Нанесение разметки	км/м2	4,753/577,20																								
Проспект Мира от улицы Юрия Смирнова до улицы Костромская							1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев																										
Замена бортового камня	п.м.	80																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	11 514,55																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	11594,55/1120																								
Устройство верхнего слоя покрытия из толщиной 5 см из ЩМА-16 на ПБВ	м2/тн	11594,55/1449																								
Ремонт колодцев	шт	4,00																								
Разметка	км/м2	2,923/113,4																				Д				
Бульвар Петрковский, от дома № 38 до дома № 2 по площади Конституции							1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция водопроводного ввода, строительство сети водопровода, строительство сети канализации.												Д	Д													
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети 1ТК-39-1ТК-41 по бульвару Петрковского, ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1 562,00																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	7 906,48																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	61,10																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	8387,4/810																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	8387,4/1048																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	4634/555																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 067,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	6,00																								
Ремонт колодцев	шт	15,00																								
Восстановление газонов	м2	3 872,00																								
Нанесение разметки	км/м2	0,763/270,2																								
Площадь Конституции от улицы Лагерная до улицы Советская							1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
Замена бортового камня	п.м.	1 016,00												Д	Д											
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	5 054,30																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	575,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	16,60																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	5664//531																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	5664/531																								
Ремонт тротуаров (устройство плит. покрытия)	м2	696,00																								
Ремонт тротуаров а/б	м2	1 461,00																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	928,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	3,00																								
Ремонт колодцев	шт	10,00																								
Восстановление газонов	м2	1 754,00																								
Ул. Гагарина, от ул. Советская до дома № 21 по улице Гагарина (включая проезд от ул. Гагарина до пл. Конституции)							1 ЭТАП					2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП		
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, капитальный ремонт сети канализации, замена водопровода.																										
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлическихиспытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1932,00																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	4249,00																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	3710,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	29,60																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	8696/815																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	8696/1087																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	2287/267																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1656,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	3,00																								
Восстановление газонов	м2	5210,00																								
валка деревьев																										
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м.	10/80																								
Разметка	м2/км	33/0,425																								
Ремонт колодцев	шт	10																								

Директор МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора ООО "Дормострой" О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ" П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2" И.В. Шипова
